


# 報告の内容

- ・上サロベツ自然再生事業における位置づけ
- •緩衝帯
  - (1)緩衝帯の概要
  - (2) モニタリング結果
  - (3) 次年度のモニタリング計画
- 沈砂池
  - (1)沈砂池の概要
  - (2) モニタリング結果
  - (3) 次年度のモニタリング計画
- ・まとめ

## 上サロベツ自然再生事業における位置づけ




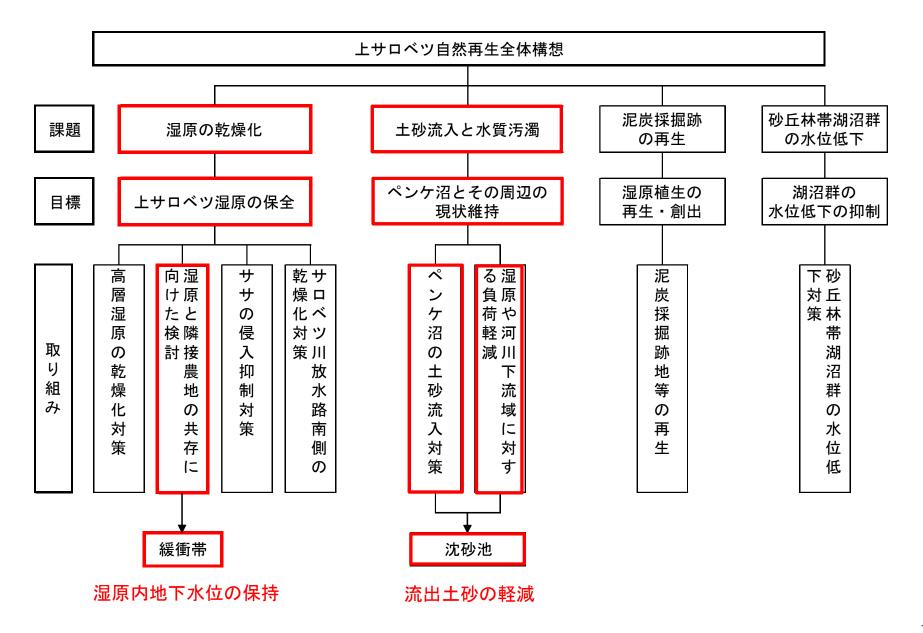

## (1) 緩衝帯の概要①

#### 緩衝帯の目標

農地と湿原の隣接箇所において、農地では**適度の地下水位を保持**し、湿原地 下水位は現状よりも低下させないことを目標とする。

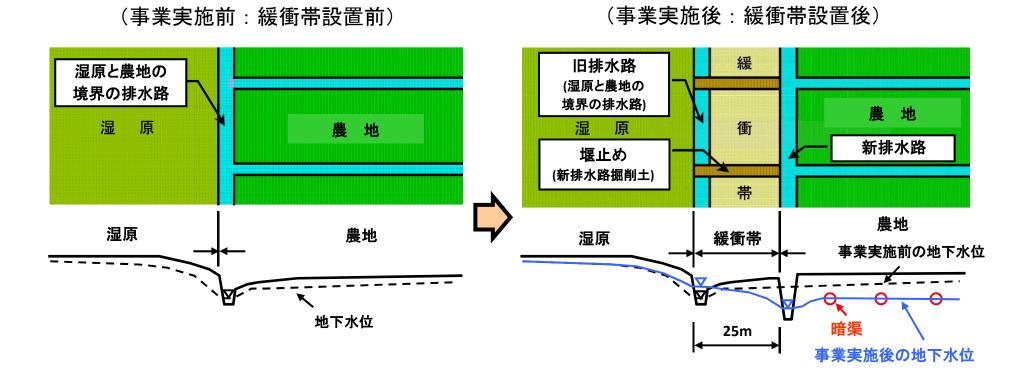

## (1) 緩衝帯の概要②

緩衝帯設置位置は「⑦農地と湿原が隣接する区間」である。 6ライン、約10kmとした。



① 農地と湿原の間に防風 林等がある区間



② 農地と湿原の間に民有 地がある区間



③ 農地と湿原の間に河川 が流下している区間



④ 農地と湿原の間に舗装 道路がある区間



⑤ 農地と湿原の間に耕作 道路がある区間



徳満

国立公園区域

豊富田

⑥ 農地と湿原の間に土盛 がある区間



⑦ 農地と湿原が隣接している区間



## 【参考】モニタリング箇所の絞り込み (二期調査への移行)

#### 1) 地下水位調査

移行方針:各緩衝帯12~17箇所の観測地点を7箇所に絞り込む

移行時期:緩衝帯の効果が確認できた翌年(緩衝帯設置後2年を目途に確認)

#### 2) 植生調査

移行方針:調査地点を5地点に絞り込み、1地点あたり3区画で調査


移行時期:地下水位調査の移行時期と同時期

#### [地下水位調查]

地下水位観測孔 (現況1ライン12~17孔)

[植生調査(コドラート調査)]

調査区画 (現況1ライン40区画程度)

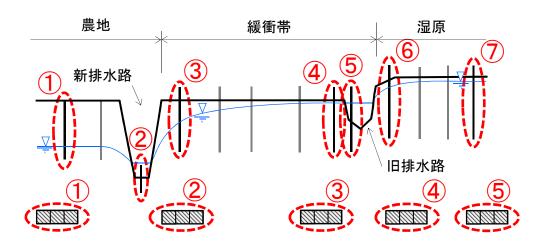


○ モニタリングの移行による絞り込み 地点(1地点あたり3区画)

モニタリング箇所概念図

## (2) モニタリング結果①


#### 1) 湿原の地下水位保持効果の確認

・湿原側の地下水位は、緩衝帯設置前と比べ概ね同等である。また、暗渠排水等の工事が施工済みの農地については、農地側の地下水位は、計画どおりに低下している。

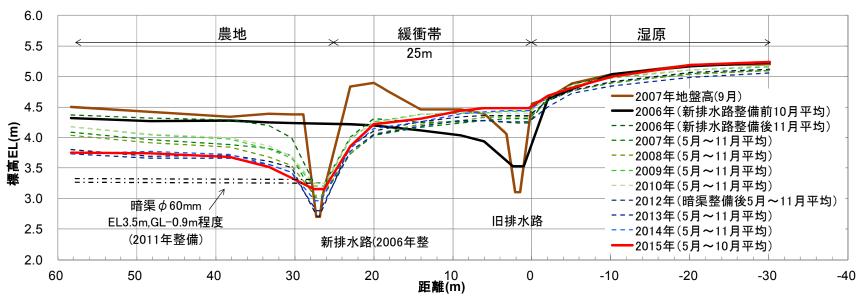


落合緩衝帯(北)(高位泥炭地) 年平均地下水位

## (2) モニタリング結果②

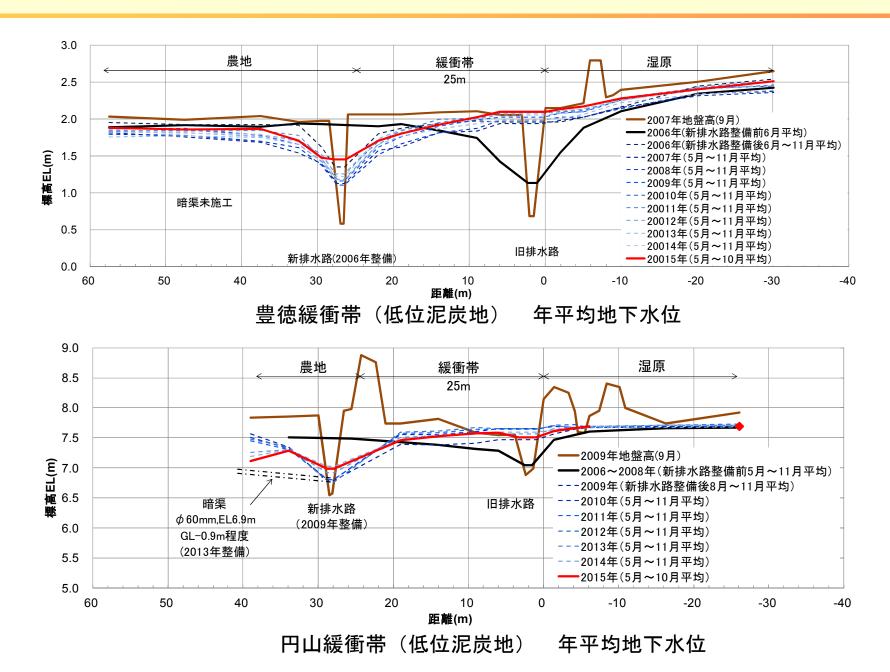

## (2) モニタリング結果③

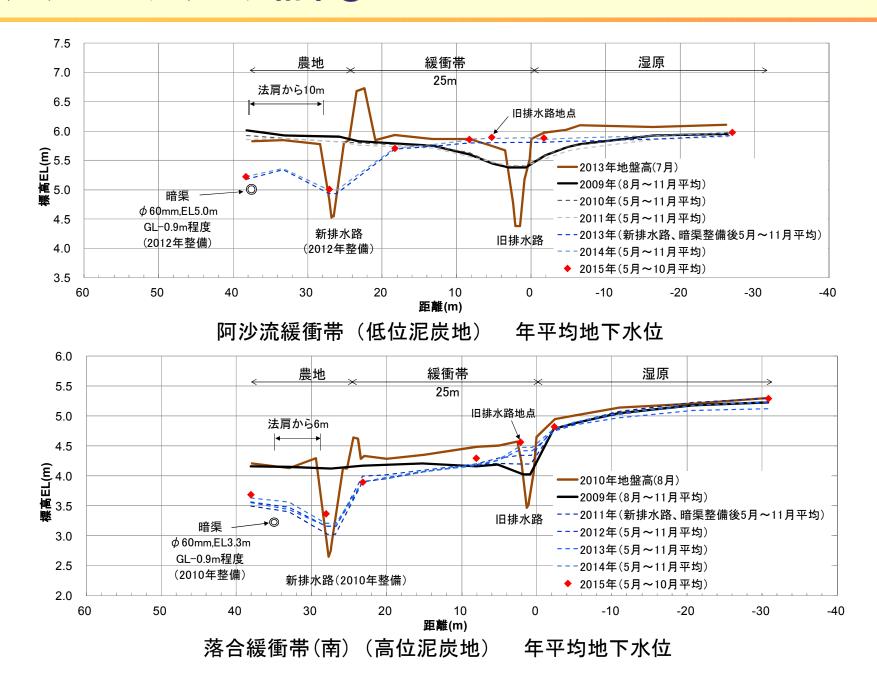

# (2) モニタリング結果④

#### 2) 周辺植生への影響の確認


- ・緩衝帯の設置前後で湿原内の植生に大きな変化は見られない。
- ・緩衝帯設置前に比べ、地下水位が上昇している緩衝帯の旧排水路側では、湿生植物の優占度が経年的に高くなっている。

#### 阿沙流緩衝帯 湿生植物の優占度



## (3) 次年度のモニタリング計画

- ・ 平成28年度からは、工事完了後2年以上経過し、緩衝帯の効果が確認された円 山緩衝帯についても二期調査に移行する(移行地点は全4路線)。
- 落合緩衝帯(北)の地下水位観測は、実証試験地として最も長い観測データを 有することから通常調査を継続する。

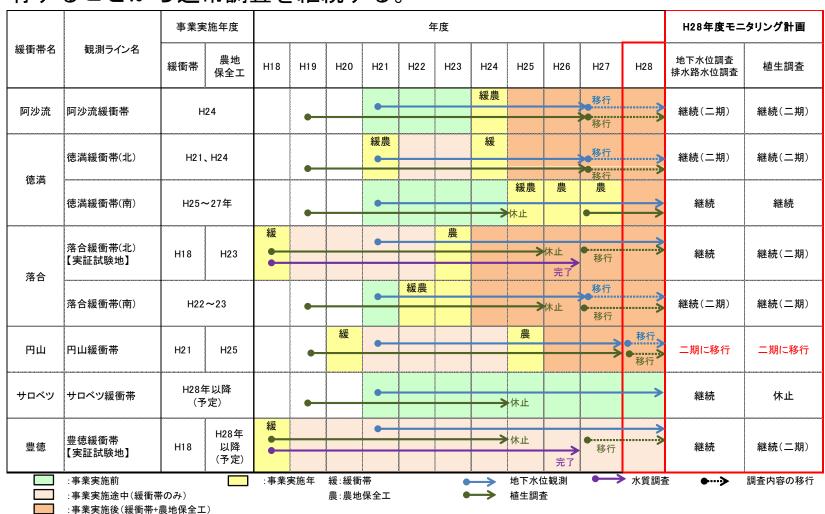




## (1)沈砂池の概要①

### 沈砂池の目標

農地及び農業用排水路からペンケ沼及びサロベツ川等への土砂流出量の軽減 を図ることを目標とする。

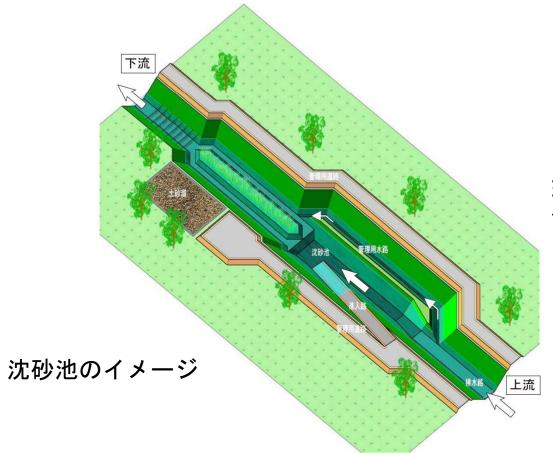

現在までに18路線で設置済み(全22路線)

## (1)沈砂池の概要②


#### 調査路線の選定

・土質、傾斜、土地利用から流域 特性をA~Dの4タイプに分類し、 調査可能期間等を考慮して、調査 路線を選定した。

#### 排水路のタイプ別区分


流域特性 タイプ	タイプ分けの条件	路線数	排水路名		
	鉱質土主体				
Α	傾斜3度以上主体	1路線	豊徳		
	林地30%未満、裸地1%以上				
	鉱質土主体		<b>芦川</b> 、徳満、開源、		
В	傾斜3度以上主体	7路線	兜沼東、豊栄第2、 豊栄第3、豊栄第4		
	林地30%以上、裸地1%未満				
	泥炭主体		清明第1·第2、 十一幹線、新生、		
С	傾斜3度未満 概ね90%以下	9路線	豊里第1、豊里第2、 豊里第3、豊栄第1、 円山		
	林地30%未満				
	泥炭主体		落合南、落合北、 阿沙流、落合東、 西豊富		
D	傾斜3度未満 概ね100%	5路線			
	林地30%未満				

※赤文字は調査対象路線

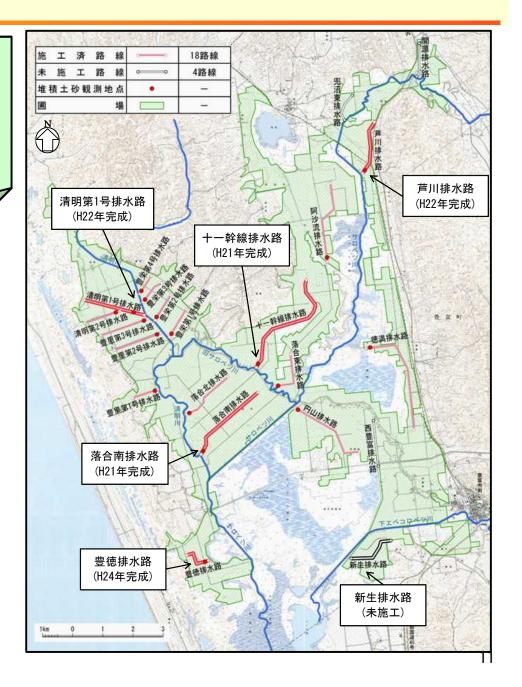


# (2)モニタリング結果①

### 1) 堆積土砂量の変化

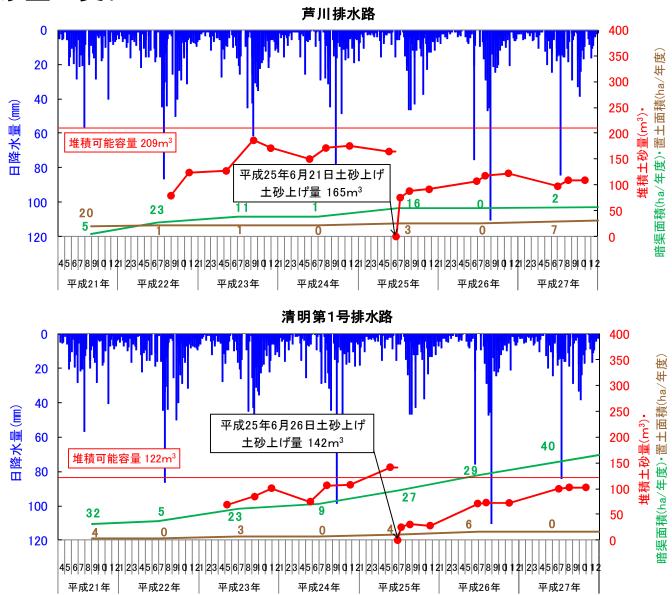

# (2) モニタリング結果②

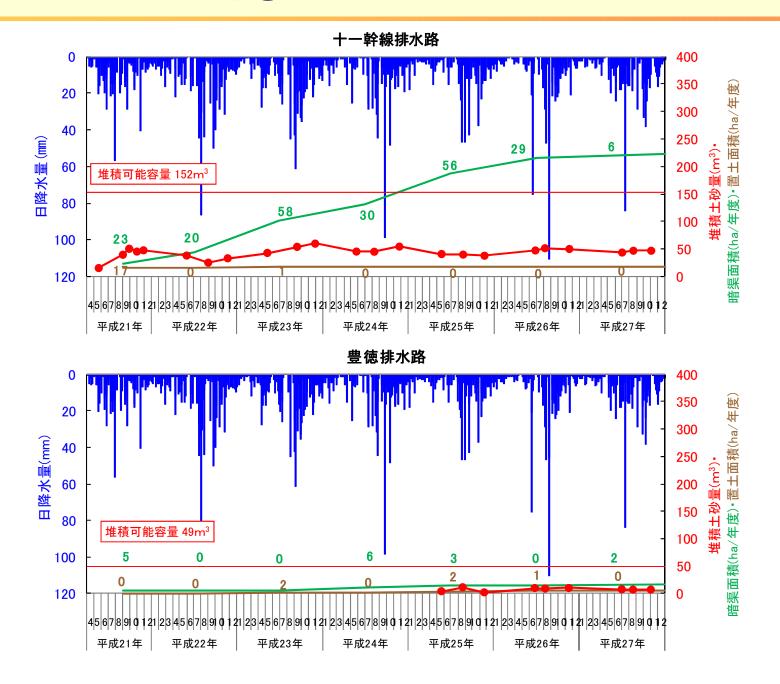

# (2) モニタリング結果③

### 2) 現在までの累計捕捉土砂量

	排水路名	整備後経過年	堆 積 可能容量 (m³)	堆積土砂量(m³)		増減量	H27年堆砂率	土砂上げ量	
No				H26年11月	H27年11月	H27年-H26年 (m³)	(%)	(m <sup>3</sup> )	備考
1	芦川	5年	209	122	101	-21	48	165 (H25.6)	
2	十一幹線	6年	152	50	43	-7	28		
3	落合南	6年	311	309	395	86	127	58 (H24.8)	
4	清明第1号	5年	122	72	104	32	85	142 (H25. 6)	
5	豊徳	3年	49	10	6	-4	12		
6	山田	5年	331	234	206	-28 62			
7	落合北	6年	184	65	37	-28	-28 20		*
8	徳満	6年	226	123	115	-8	51		*
9	豊里第3号	4年	126	9	19	10	15		*
10	阿沙流	3年	403	59	40	-19	10		*
11	落合東	3年	100	13	2	-11	2		*
12	豊栄第1号	3年	270	59	48	-11	18		*
13	豊栄第2号	3年	78	13	16	3	21		*
14	豊栄第3号	3年	97	66	61	<b>-</b> 5	63		
15	豊栄第4号	2年	85	26	34	8	40		*
16	豊里第1号	2年	62	44	62	18	100		
17	豊里第2号	2年	87	9	17	8	20		*
18	清明第2号	1年	35	-	4	-	11		*
小計 1283					1310	-	-	365	
		合詞	计		1675				
<b>*</b> 1	簡易測定によ	る沈砂池	.堆積土砂量		: H27の堆砂率が80%以上の				

<sup>※</sup> 簡易測定による沈砂池堆積土砂量

・沈砂池全体で、約1,700 m3の土砂を捕捉しており、湿原や河川下流域に 対する負荷を軽減している。

## 【参考】沈砂池堆積土砂量の簡易的な方法による測定

#### ●簡易的な測定の目的


事業完了後の地元主体によるモニタリングを見据えた効率的な調査手法検討のた め、簡易な手法により堆積土砂量を測定。

#### ●堆積土砂量の簡易測定方法

・スタッフを使用して沈砂池に設置した木杭から堆積土砂上面までの長さを計測 し、換算表から土砂量を測定する。

ま で

- 計測場所は各沈砂池で1地点とする。
- ①木杭から堆積土砂上面までの長さ(L)を 計測する。





#### ②沈砂池ごとの計測値(L)と堆積土砂量の 換算表から堆積状況を把握する。

し計測値の小数第2位

		0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
$\rightarrow$	3.2	401.2	399. 4	397. 7	396.0	394.2	392.5	390.7	389.0	387.2	385.5
計	3.3	383.8	382.0	380.3	378.5	376.8	375.1	373.3	371.6	369.8	368.1
	3.4	366. 3	364.6	362.9	361.1	359.4	357.6	355.9	354.2	352.4	350.7
測	3.5	348.9	347. 2	345.4	343.7	342.0	340.2	338.5	336.7	335.0	333.3
	3.6	331.5	329.8	328.0	326.3	324.5	322.8	321.1	319.3	317.6	315.8
値	3.7	314.1	312.4	310.6	308.9	307.1	305.4	303.6	301.9	300.2	298.4
の	3.8	296.7	294. 9	293. 2	291.5	289.7	288.0	286. 2	284.5	282.7	281.0
Ċ	3.9	279.3	277. 5	275.8	274.0	272.3	270.6	268.8	267.1	265.3	263.6
小	4.0	261.8	260.1	258.4	256.6	254.9	253.1	251.4	249.7	247.9	246.2
-	4.1	244. 4	242.7	240.9	239.2	237.5	235.7	234.0	232.2	230.5	228.8
数	4.2	227.0	225.3	223.5	221.8	220.0	218.3	216.6	214.8	213.1	211.3
第	4.3	209.6	207.9	206.1	204.4	202.6	200.9	199. 1	197.4	195.7	193.9
ਆ	4.4	192. 2	190.4	188.7	187.0	185.2	183.5	181.7	180.0	178.2	176.5
1	4.5	174.8	173.0	171.3	169.5	167.8	166.0	164.3	162.6	160.8	159.1

~例~落合南排水路で計測値(L)が3.35mの場合、 堆積土砂量は換算表より375.1m3

## (3) 次年度のモニタリング計画

	No.	沈砂池	施工年度	堆積土砂計測	堆積土砂土質試験 (粒度組成等)			
			+12	実施方針①	実施方針②			
	1	芦川排水路	H22	継続	-			
調	2	十一幹線排水路	H21	継続	_			
査代	3	落合南排水路	H21	継続	-			
表路	4	清明第1号排水路	H22	継続	-			
線	5	豊徳排水路	H24	継続	-			
	6	新生排水路	未施工	[施工後に実施]				
	7	円山排水路	H22	継続(簡易)	-			
	8	落合北排水路	H21	継続(簡易)	-			
	9	徳満排水路	H21	継続(簡易)	-			
	10	豊里第3号排水路	H23	継続(簡易)	-			
そ	11	阿沙流排水路	H24	継続(簡易)	-			
の	12	落合東排水路	H24	継続(簡易)	-			
他の	13	豊栄第1号排水路	H24	継続(簡易)	-			
路線	14	豊栄第2号排水路	H24	継続(簡易)	-			
称	15	豊栄第3号排水路	H24	継続(簡易)	-			
	16	豊栄第4号排水路	H25	継続	継続			
	17	豊里第1号排水路	H25	継続	継続			
	18	豊里第2号排水路	H25	継続	継続			
	19	清明第2号排水路	H26	継続	新規			
		合計		18箇所	4箇所			

#### 【実施方針① 堆積土砂計測】

- ・調査代表路線は深浅測量による計測を継続実施する。
- ・その他の路線は完成後3年間は深浅 測量による計測を実施し、その後、 事業完了後を見据えた簡易的な測定 に移行する。

#### 【実施方針② 堆積土砂土質試験】

・完成後3年間は継続実施する。

## まとめ

### 【緩衝帯】

湿原内の地下水位は保たれており、緩衝帯の湿原地下水位 保持効果は発揮されている。

### 【沈砂池】

・沈砂池全体で、約1,700㎡の土砂が捕捉されており、下流域 への流下土砂軽減効果は発揮されている。

## 【モニタリングの移行】

・緩衝帯、沈砂池ともに、これまでの調査と同様に効果の発揮 状況が確認できたことから、調査手法の移行は妥当であると 考える。

今後は、サロベツ地区完了後の地元主体による維持管理・モニタリングに向けた実用的かつ有効な手法の検討を行っていく。

